


Aanvulling op de participatiewijzer van de Nationale ombudsman inzake detaillering spelregel 4: co-produceren en meebeslissen. Het Protocol is gebaseerd op de open standaard Coördinatie van Open OverheidsProjecten (COOP).


Opstarten open projecten

- 1 Nieuw project
- 2 Verwijs naar Protocol in projectopdracht o.g.
- 3 Stel lijst samen van alle stakeholders
- 4 Definieer projectstappen burgerparticipatie
- 5 Opzetten projectwebsite Web 2.0+
- 6 Volg standaard opbouw projectstappen
- 7 Gebruik checklijsten COOP o.g.

Opbouw projectstappen

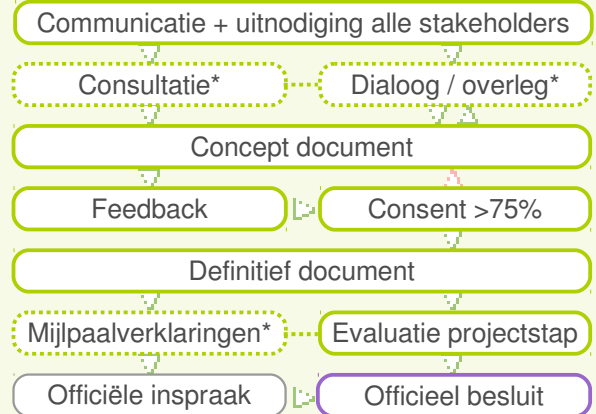

Opzet projectwebsite Web 2.0+



Opbouw open projecten

Projectfasen + projectstappen (overlappend)

0.1 Agenderen vraagstuk

Oriëntatie

- 0.2 Situatianalyse + aanbevelingen stakeholders*
- 0.3 Kostenraming + aanvragen/reserveren budget
- 0.4 Vaststellen projectdoelen + projectfinanciering

1 Project(team) start up, hoofdlijnen

Interactieve beleids- & planvorming

- 2 Uitwerken uitvoering, detaillering projectfase(n)
- 3 Onderzoek meest ideale eindbeeld*
- 4 Vaststellen ontwerpkaders*
- 5 Ontwerpen schetsvoorstel(len)*

Open (source) ontwikkeling

- 6 Uitwerken ontwerp, detaillering > 30%
- 7 Uitwerken ontwerp, detaillering > 70%
- 8 Uitwerken ontwerp, detaillering > 85%
- 9 Aanbesteding / overdracht naar praktijk

Implementeren / realiseren

10 Uitwerken uitvoering + werkplanning

Documenten voor officieel besluit (mijlpalen)

Beleidsverklaring Open project

Nota / advies / rapport / voorstel / visie
Kosten-batenanalyse / haalbaarheidsonderzoek
Nota van uitgangspunten / programma / projectkaders
Startdocument / marsroute / plan van aanpak

Project Initiatie Document
Denkrichtingenrapportage / wensenlijst
Nota van randvoorwaarden / programma van eisen
Schetsplan / voorkeurontwerp

Voorontwerp / functioneel ontwerp / alfa-versie
Definitief ontwerp / bèta-versie
Eindontwerp / bestek en voorwaarden / release candidate
Opdracht / overdracht / release to market

Werkdocumenten
